



AYUNTAMIENTO DE NEIBA



ALCALDÍA DE NEIBA

RNC 417-00027-8

"Construyendo junto la Ciudad que soñamos"

Despacho del Alcalde

09 de mayo de 2022

Señora
Pelagia Segura
Presidente, Concejo de Regidores
Su Despacho.


Honorable Señora Presidente:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Final** de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2021.

Atentamente,



Lic. José Darío Cepeda Medina
Alcalde Municipal

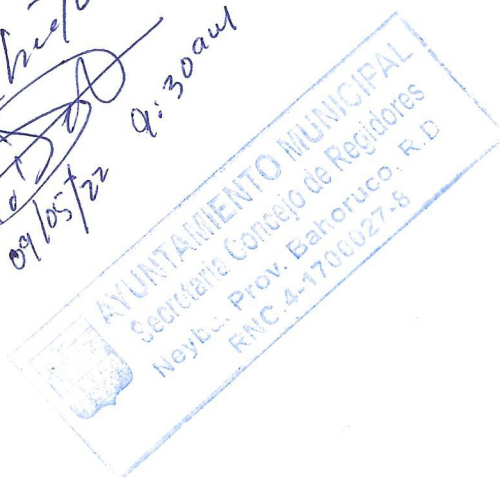



AYUNTAMIENTO DE NEIBA



ALCALDIA DE NEIBA

RNC 417-00027-8

"Construyendo junto la Ciudad que soñamos"

Despacho del Alcalde

09 de mayo de 2022

Señores
Miembros del Comité de Seguimiento
Presupuesto Participativo Municipal 2021
Sus Manos

Estimados Señores:


Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Final** de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2021.


Atentamente,

Lic. José Darío Cepeda Medina
Alcalde Municipal



Recibido por
09/05/22 9:03 am

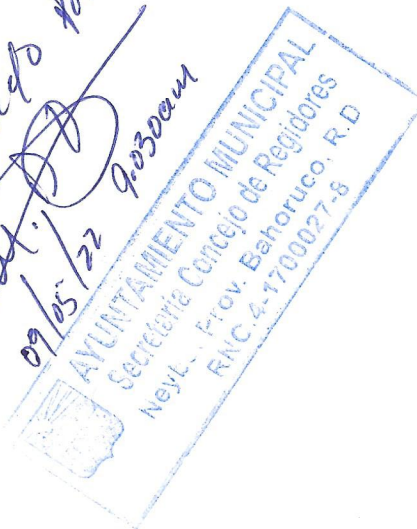



Ayuntamiento Municipal de Neiba

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2021
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
ENERO-DICIEMBRE 2021



RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Aceras y Contenes. El Maquito	1,500,000.00	902,990.22			X			Estas obras continuaron siendo ejecutadas en el 2022
Construcción de Aceras y Contenes. El Pozo	1,200,000.00	618,000.00			X			
Apertura de Calle Proyecto No 1	1,000,000.00	999,943.96	X					
Construcción de Boulevard Entrada. El Estero	1,500,000.00	1,499,990.92	X					
Compra Terreno para Construcción UNAP	1,500,000.00	0.00					X	No ejecutada. no obstante los recursos de esta obra fueron destinados a los presupuesto de las demás obras por los aumento en los precios de los materiales de construcción.
TOTAL	6,700,000.00	4,020,925.10	2	0	2	0	1	

Lic. José Darío Cepeda Medina
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

09/05/2022

FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Neiba

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2021

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	2	40
OBRAS EN PROCESO	2	40
OBRAS PENDIENTES	1	20
TOTAL	5	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
6,700,000.00	4,020,925	2,679,074.90	60

Lic. José Darío Cepeda Medina
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7087

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Neyba

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha 17=15+16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
01	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION DE CONTENES EN CALLE PRINCIPAL Y SECUNDARIAS, VISTA AL LAGO	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0052			CONTINUACION CONSTRUCCION DE CONTENES, BUENOS AIRES	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, BRISAS DEL ESTE	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERUA PERIMETRAL CANCHA Y CENTRO COMUNAL, CERRO AL MEDIO	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,687.66	1,960,687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,687.66
06	0051			RECONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDOMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,687.66	1,960,687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,687.66
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0051			CONST. Y REMOD. PARADORES, LOS GUINEOS, LA CURIA, EL BOTAO, PICO, LAS CAÑAS Y EL AGUACATE	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23	0051			ELECTRIFICACION E ILUMINACION, LAS FILIPINAS/ LAS MALVINAS	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total General RD\$							4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	1,960,687.66	6,210,687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210,687.66

Lic Maria del Carmen Montilla

Preparado por

Angel Domingo Sena

Revisado por

Lic. Jose Dario Cepeda Medina

Aprobado por
